



นายสุรียนต์ – หล้าคำ รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ

31 มีนาคม 2569





รายงานความก้าวหน้า และการเร่งรัดโครงการงบประมาณ

รายงานความคืบหน้าและการเร่งรัดโครงการงบประมาณสาธารณสุข

สรุปสถานะโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลหลัก ปัญหาที่พบ และมาตรการเร่งรัดเพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามเป้าหมาย

สถานะและปัญหาของโครงการหลัก (Project Status & Obstacles)

รพ.ภูสิงห์



ล่าช้ากว่าแผน 60 วัน
สาเหตุหลัก: เหตุการณ์สู้รบชายแดน และการแก้ไขสัญญาเรื่องเสาเข็มและคานรับหลังคา

อาคารผู้ป่วยใน รพ.ภูสิงห์	ล่าช้า
งบประมาณ 44.23 ล้านบาท	งวดที่ 3/8

รพ.โนนคูณ & รพ.บุขันธ์



สิ้นสุดสัญญาและเริ่มค่าปรับรายวัน
ค่าปรับสูงสุด 29,952 บาท/วัน
ปัญหา: ผู้รับจ้างขาดเครดิตและขาดแคลนแรงงาน



อาคารอุบัติเหตุ รพ.โนนคูณ

งบประมาณ 30.38 ล้านบาท
สิ้นสุดสัญญา / ปรับรายวัน
งวดที่ 7/9



ปัญหาซ้ำซ้อนจากผู้รับจ้างรายเดียวกัน
ทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในทั้งสองพื้นที่

อาคารผู้ป่วยใน รพ.บุขันธ์

งบประมาณ 21.36 ล้านบาท
สิ้นสุดสัญญา/ปรับรายวัน
ส่งงวด 6-7- ครบแล้ว
รอแก้ไขสัญญา+รอตรวจรับ

มาตรการเร่งรัดและภาพรวมปี 2567 (Action Plan & 2024 Overview)


แผนเร่งรัดการก่อสร้าง



ประสานผู้รับจ้างให้
เพิ่มจำนวนช่าง
ทำงานล่วงเวลา



ทำงานล่วงเวลา



เร่งเอกสาร
แก้ไขสัญญา

ภาพรวมงบประมาณปี 2567




พฤษภาคม
2569

คาดการณ์วันแล้วเสร็จใหม่

โครงการ รพ.โนนคูณ เหลือ 3 งวด คาดการณ์ว่า
จะเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคม 2569

สรุปความคืบหน้าโครงการงบลงทุนปี 68: การก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลในจังหวัดศรีสะเกษ

ภาพรวมและการจัดการงบประมาณปี 2568

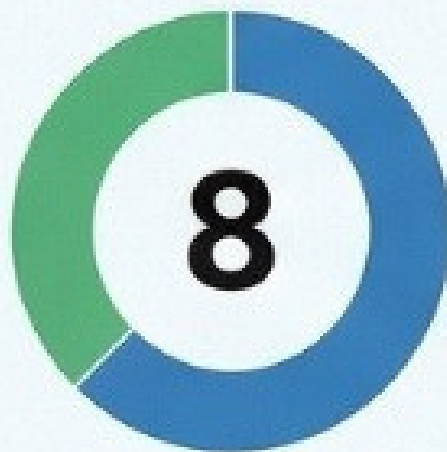

โครงการใหม่รวม 8 รายการ

เสร็จสิ้นแล้ว

3 รายการ

อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

5 รายการ

งบปีเดียว

งบผูกพันข้ามปี 68-70

งบผูกพันข้ามปี 68-71

ระบบบำบัดน้ำเสีย SW.กัณทรารมย์



งบประมาณ: 15,866,631

สิ้นสุดสัญญา: 24 สค.2569

ขั้นตอนปัจจุบัน: ก่อสร้างงวดที่ 1/6

■ ต้องเบิกจ่ายภายใน กย.2569

อาคารอุบัติเหตุ SW.อุทุมพรพิสัย



งบประมาณ: 93,940,000

สิ้นสุดสัญญา: 13 กค.2570

ขั้นตอนปัจจุบัน: ลงนามสัญญา เมื่อ 19 มค.69

ก่อสร้างงวดที่ 1/15

(งบ 68 ต้องเบิกจ่ายภายใน กย.2569)

อาคารรักษา ๔ SW.กันทรลักษ์



งบประมาณ: 554,385,700

ขั้นตอนปัจจุบัน: ลงนามในสัญญาแล้ว

เมื่อ 29 มค.2569

อาคารซักฟอก SW.น้ำเกลี้ยง



งบประมาณ: 6,854,000

สิ้นสุดสัญญา 30 เมย.2569

ขั้นตอนปัจจุบัน: ก่อสร้างงวดที่ 3/4

อาคารส่งเสริม ๔ SW.เมืองจันทร์



งบประมาณ: 27,860,000

สิ้นสุดสัญญา: 21 ตค.2569

ขั้นตอนปัจจุบัน: ลงนามสัญญา เมื่อ 14 มค.69

ก่อสร้างงวดที่ 1/6



ปัญหาความล่าช้าที่พบ

การปรับแก้แบบก่อสร้าง (SW.กัณทรารมย์ 4 ครั้ง)

ผู้รับจ้างหยุดพักงาน (SW.น้ำเกลี้ยง 80 วัน)




มาตรการเร่งรัดงานก่อสร้าง

ทำขึ้นผู้รับจ้างเพิ่มจำนวนช่าง/คนงาน

ทำงานล่วงเวลา

เร่งเบิกจ่ายภายใน ก.ย. 69



สรุปงบประมาณสิ่งก่อสร้างใหม่ ปีงบประมาณ 2569



โครงการไฮไลต์และงบประมาณผูกพันข้ามปี

อาคารผู้ป่วยใน 12 ชั้น รพ.ศรีสะเกษ

วงเงินงบประมาณสูงสุด รายการผูกพันข้ามปี 2569-2571

554,385,700 บาท

เสนอเพิ่มรายการการจัดทำแผนรายนการ + TOR
(ยังไม่รายงานผลการจัดทำราคากลาง)



อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ปราณบุรี

งบประมาณผูกพันปี 2569-2570

วงเงินรวม

74,691,400 บาท

เสนอราคา 1 เม.ย.2569



อาคารที่พักอาศัย รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ

อาคารห้องชุดครอบครัวรายการผูกพันข้ามปี 2569-2570

วงเงิน 14,904,200 บาท

อยู่ขั้นตอนแจ้งทำสัญญา

รอสำนักงานงบประมาณเห็นชอบความเหมาะสมของราคา




โครงการงบปีเดียวและสถานะการดำเนินงาน



กลุ่มอาคารสนับสนุนและงานระบบ

รายการสิ่งก่อสร้าง	โรงพยาบาล	วงเงินงบประมาณ (บาท)
อาคารตรวจรักษาฯ	รพ.บึงนาราง	15,000,000
อาคารโรงซ่อมบำรุงพัสดุ	รพ.วังหิน	8,789,000
อาคารพัสดุ	รพ.ไพรบึง	8,596,400

สถานะทั้ง 3 โครงการ



ลงนามสัญญาแล้ว



ขอบคุณครับ

