



นายสุริยนต์ หล้าคำ รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ

4 มีนาคม 2569





รายงานความก้าวหน้า และการเร่งรัดโครงการงบประมาณ



รายงานความคืบหน้าและการเร่งรัดโครงการงบประมาณสาธารณสุข

สรุปสถานะโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลหลัก ปัญหาที่พบ และมาตรการเร่งรัดเพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามเป้าหมาย

สถานะและปัญหาของโครงการหลัก (Project Status & Obstacles)

รพ.ภูสิงห์

ล่าช้ากว่าแผน 60 วัน

สาเหตุหลัก: เหตุการณ์สู้รบชายแดน และการแก้ไขสัญญาเรื่องเสาเข็มและคานรับหลังคา

อาคารผู้ป่วยใน รพ.ภูสิงห์

ล่าช้า

งบประมาณ 44.23 ล้านบาท

60 วัน
(งวดที่ 3/8)



รพ.โนนคูณ & รพ.บุษันร์

สิ้นสุดสัญญาและเริ่มค่าปรับรายวัน

ค่าปรับสูงสุด 29,952 บาท/วัน

ปัญหา: ผู้รับจ้างขาดเครดิตและขาดแคลนแรงงาน



อาคารอุบัติเหตุ รพ.โนนคูณ

งบประมาณ 30.38 ล้านบาท
สิ้นสุดสัญญา/ปรับรายวัน
(งวดที่ 6/9)

ปัญหาซ้ำซ้อนจากผู้รับจ้างรายเดียวกัน ทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในทั้งสองพื้นที่

อาคารผู้ป่วยใน รพ.บุษันร์

งบประมาณ 21.36 ล้านบาท
สิ้นสุดสัญญา/ปรับรายวัน
(งวดที่ 6/8)

มาตรการเร่งรัดและภาพรวมปี 2567 (Action Plan & 2024 Overview)

แผนเร่งรัดการก่อสร้าง



ประสานผู้รับจ้าง
ให้เพิ่มจำนวนช่าง



ทำงานล่วงเวลา



เร่งเอกสาร
แก้ไขสัญญา

ภาพรวมงบประมาณปี 2567

สำเร็จแล้ว
70%
(7 รายการ)

ทั้งหมด
10
รายการ

อยู่ระหว่าง
บริหารสัญญา
(3 รายการ)


พฤษภาคม
2569

คาดการณ์วันแล้วเสร็จใหม่

คาดว่าโครงการ รพ.โนนคูณ และ รพ.บุษันร์ จะเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคม 2569

สรุปความคืบหน้าโครงการงบลงทุนปี 68: การก่อสร้างอาคาร โรงพยาบาลในจังหวัดศรีสะเกษ

ภาพรวมและการจัดการงบประมาณปี 2568

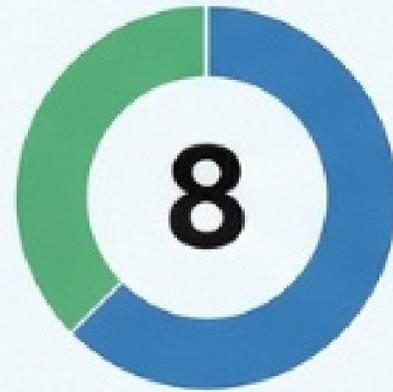

โครงการใหม่รวม 8 รายการ

เสร็จสิ้นแล้ว

3 รายการ

อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

5 รายการ

งบปีเดียว

ระบบบำบัดน้ำเสีย SW.กันทรารมย์



งบประมาณ: 15,866,631

สิ้นสุดสัญญา: 24 สค.2569

ขั้นตอนปัจจุบัน: ก่อสร้างงวดที่ 1/6

- ต้องเบิกจ่ายงบภายใน กย.2569

งบผูกพันข้ามปี 68-70

อาคารอุบัติเหตุ SW.อุทุมพรพิสัย



งบประมาณ: 93,940,000

สิ้นสุดสัญญา: 13 กค.2570

ขั้นตอนปัจจุบัน: ลงนามสัญญา เมื่อ 19 มค.69

ก่อสร้างงวดที่ 1/15

(งบ 68 ต้องเบิกจ่ายภายใน กย.2569)

งบผูกพันข้ามปี 68-71

อาคารรักษา ๔ SW.กันทรลักษ์




งบประมาณ: 554,385,700

ขั้นตอนปัจจุบัน: ลงนามในสัญญาแล้ว

เมื่อ 29 มค.2569

อาคารซักฟอก SW.น้ำเกลี้ยง



งบประมาณ: 6,854,000

สิ้นสุดสัญญา: 30 เมย.2569

ขั้นตอนปัจจุบัน: ก่อสร้างงวดที่ 2/4

- ค่าปรับวันละ 6,854 บาท

อาคารส่งเสริมฯ SW.เมืองจันทร์



งบประมาณ: 27,860,000

สิ้นสุดสัญญา: 21 ตค.2569

ขั้นตอนปัจจุบัน: ลงนามสัญญา เมื่อ 14 มค.69

ก่อสร้างอยู่งวดที่ 1/6




ปัญหาความล่าช้าที่พบ

- การปรับแก้แบบก่อสร้าง (SW.กันทรารมย์ 4 ครั้ง)
- ผู้รับจ้างหยุดพักงาน (SW.น้ำเกลี้ยง 80 วัน)



มาตรการเร่งรัดงานก่อสร้าง

- ทำชั้นผู้รับจ้างเพิ่มจำนวนช่าง/คนงาน
- ทำงานล่วงเวลา
- เร่งเบิกจ่ายภายใน ก.ย. 69



สรุปงบประมาณสิ่งก่อสร้างใหม่ ปีงบประมาณ 2569



โครงการไฮไลท์และงบประมาณผูกพันข้ามปี

อาคารผู้ป่วยใน 12 ชั้น รพ.ศรีสะเกษ

วงเงินงบประมาณสูงสุด รายการผูกพันข้ามปี 2569-2571
554,385,700 บาท

เสนอเพิ่มรายงานผลจัดทำแผนบูรณาการ + TOR
(ยังไม่รายงานผลการจัดทำราคากลาง)

อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ปราณบุรี

งบประมาณผูกพันปี 2569-2570
วงเงินรวม
74,691,400 บาท

เผยแพร่ร่างประกาศ 23 กพ.2569

อาคารที่พักอาศัย รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ

อาคารห้องชุดครอบครัว รายการผูกพันข้ามปี 2569-2570
วงเงิน **14,904,200 บาท**


อยู่ขั้นตอนแจ้งทำสัญญา

โครงการงบปีเดียวและสถานะการดำเนินงาน

กลุ่มอาคารสนับสนุนและงานระบบ

รายการสิ่งก่อสร้าง	โรงพยาบาล	วงเงินงบประมาณ (บาท)
อาคารตรวจรักษา	รพ.บึงบูรพ์	15,000,000
อาคารโรงซ่อมบำรุงพัสดุ	รพ.วังหิน	8,789,000
อาคารพัสดุ	รพ.ไพรบึง	8,596,400

สถานะ ทั้ง 3 โครงการ



อยู่ขั้นตอนแจ้งทำสัญญา





ขอบคุณครับ

