




นายสุรียนต์ หล้าคำ

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

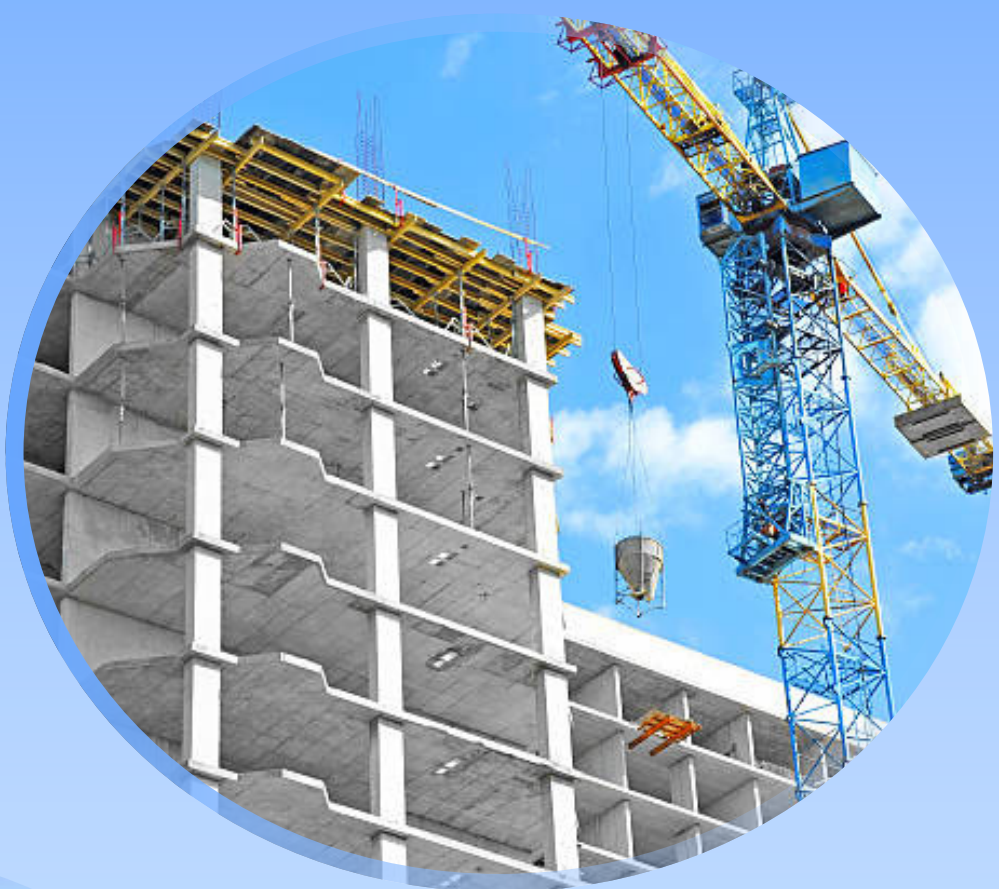

30 มกราคม 2569



หัวข้อนำเสนอ

ความก้าวหน้า ติดตามและเร่งรัดรายการ สิ่งก่อสร้าง



ความก้าวหน้า ติดตามและเร่งรัดรายการสิ่งก่อสร้าง

รายการงบลงทุน 67

26 มค.69

ที่	รายการ	งบประมาณ	สิ้นสุดสัญญา	ขั้นตอนปัจจุบัน
1	อาคารผู้ป่วยใน รพ.ภูสิงห์	ผูกพันข้ามปี 67-69	7 มิย.69	-ก่อสร้างอยู่งวดที่ 3/8 -งานล่าช้าจากสัญญา 60 วัน -รวบรวมเอกสารขออนุมัติหยุดพักงาน,แก้ไขคานหลังคา, ขอขยายระยะเวลาก่อสร้าง
2	อาคารอุบัติเหตุ รพ.โนนคูณ	ผูกพันข้ามปี 67-69	16 มค.69	-ก่อสร้างอยู่งวดที่ 6/9 -สิ้นสุดสัญญา และมีค่าปรับเกิดขึ้นแล้ว -ค่าปรับวันละ 29,952 บาท
3	อาคารผู้ป่วยใน รพ.ขุนันธ์	ผูกพันข้ามปี 67-69	11 มค.69	-ก่อสร้างอยู่งวดที่ 6/8 -สิ้นสุดสัญญา และมีค่าปรับเกิดขึ้นแล้ว -ค่าปรับวันละ 21,360 บาท



ความก้าวหน้า ติดตามและเร่งรัดรายการสิ่งก่อสร้าง

26 มค.69

รายการงบประมาณ 68

ที่	รายการ	งบประมาณ	สิ้นสุดสัญญา	ขั้นตอนปัจจุบัน
1	อาคารอุบัติเหตุฯ รพ.อุทุมพรพิสัย	ผูกพันข้ามปี 68-70	13 กค.70	-ลงนามสัญญา เมื่อ 19 มค.69 -ก่อสร้างอยู่งวดที่ 1/15 (งบ 68 ต้องเบิกจ่ายงบภายใน ก.ย.69)
2	อาคารส่งเสริมฯ รพ.เมืองจันทร์	ผูกพันข้ามปี 68-70	21 ตค.69	-ลงนามสัญญา เมื่อ 14 มค.69 -ก่อสร้างอยู่งวดที่ 1/6
3	ระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.กันทรารมย์	งบปีเดียว	24 ส.ค.69	-ก่อสร้างอยู่งวดที่ 1/6 -ต้องเบิกจ่ายงบภายใน ก.ย.69
4	อาคารซักฟอก รพ.น้ำเกลี้ยง	งบปีเดียว	30 เม.ย.69	-ก่อสร้างอยู่งวดที่ 2/4 -ค่าปรับวันละ 6,854 บาท
5	อาคารรักษาฯ รพ.กันทรลักษณ์	ผูกพันข้ามปี 68-71		เสนอลงนามสัญญา เมื่อ 26 มค.69

ความก้าวหน้า ติดตามและเร่งรัดรายการสิ่งก่อสร้าง

รายการงบลงทุน 69

26 มค.69

ที่	รายการ	งบประมาณ	ขั้นตอนปัจจุบัน
1	อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ปรางค์กู่	ผูกพันข้ามปี 69-70	ประชุมจัดทำราคากลาง เมื่อ 23 มค.69
2	อาคารห้องชุดครอบครัวฯ รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ	ผูกพันข้ามปี 69-70	เสนอราคา 30 มค.69
3	อาคารตรวจรักษาฯ รพ.บึงบูรพ์	งบปีเดียว	เสนอราคา 30 มค.69
4	อาคารโรงซ่อมบำรุงพัสดุ รพ.วังหิน	งบปีเดียว	เสนอราคาแล้ว เมื่อ 26 มค.69
5	อาคารพัสดุ รพ.ไพรบึง	งบปีเดียว	เสนอราคาแล้ว เมื่อ 26 มค.69
6	อาคารผู้ป่วยในฯ 12 ชั้น รพ.ศรีสะเกษ	ผูกพันข้ามปี 69-71	เสนอเพิ่มเติมตั้ง คกก.กำหนดราคากลาง



การเร่งรัดและแก้ไขปัญหาการดำเนินงานก่อสร้าง

รายการลงทุน 67-68

ผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้มีการบริหารสัญญา เช่น

1. เร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามข้อกำหนดในสัญญา และให้ได้เป้าหมายการเบิกจ่ายเงิน และป้องกันการพังบ
2. หากงานล่าช้าขอให้ประธานผู้รับจ้างให้เพิ่มจำนวนช่าง คนงาน และจัดให้มีการทำงานล่วงเวลา
3. ให้ก่อสร้างตามแบบรูปรายการตามสัญญา หากต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบแปลนก่อสร้าง ให้รายงานต่อผู้มีอำนาจเพื่อทราบหรือสั่งการ โดยด่วน !
4. ให้แก้ไขสัญญาก่อนการตรวจรับ !

รายการลงทุน 69 อยู่ขั้นตอน e-bidding

1. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ ไม่ควรแก้ไขเพิ่มเติมแบบก่อสร้าง !
2. ตรวจสอบชื่อรายการ แบบแปลน BOQ รายละเอียด ว่าถูกต้องตรงกัน





ขอบคุณครับ

